

Aannemingen **VERELST**

Track Record

Met deze track record willen wij u laten zien hoe een woning van a tot z opgebouwd wordt, zodat u zich hiervan nu reeds een goed beeld kan vormen. Onze woningen worden ontwikkeld en gerealiseerd in nauwe samenwerking met een professioneel team van vakbekwame mensen gaande van architect, commercieel bouwadviseur, werfleider tot arbeider. De gemiddelde bouwtermijn voor woningen tot 200.000 € bedraagt 190 werkbare dagen.



Te bebouwen terrein rechts naast bestaande woningen. Bomen werden door klant verwijderd.



Uitgraving van de kelder, Uitgegraven grond blijft ter plaatse voor ophoging tuin.



Leegpompen water uit put en afschieten betonteent van de keldervloer buur voor het gieten van de kelder.



Plaatsen isolatie voor kelder



Nadat de kelder gegoten werd, worden de welfsels geplaatst



Aanvullen van grond naast kelder



Aanvang ruwbouwmetserwerken



Plaatsen van de welfsels boven gelijkvloers met 23 meter kraan



Wapening voor betondruklaag wordt op de welfsels geplaatst door kraanman.




Wapeningskorf voor betonbalk wordt geplaatst. Randbekisting voor druklaag op welfsels wordt geplaatst en de veiligheidsleuningen worden in orde gebracht.



De bouwlift wordt geplaatst nadat de druklaag werd gegoten.



De betonbalk werd gegoten en de opening van de lichtkoepel wordt verder bewerkt.

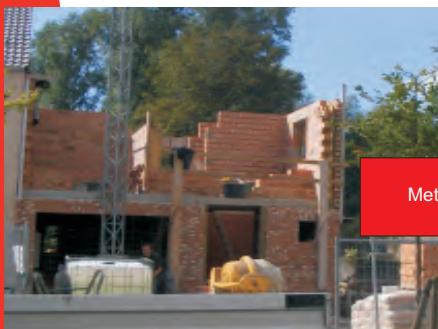

Metselwerken bovenverdieping.



Welfsel geplaatst boven verdieping met kraan.



Voordeuromlijsting in blauwe steen werd geplaatst.



Metselwerken tipgevels voor dak



Daktimmerwerken: panlatten voor plaatsen van dakpannen worden gelegd



Plaatsen van de dakpannen




Schouw werd gemetst, ronde zinken afvoerbuizen en zinken hanggoot worden geplaatst



De garagepoort werd geplaatst



Plaatsen van elektrische en sanitaire leidingen

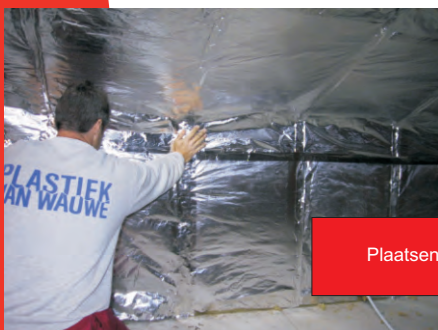

Plaatsen van dakisolatie



Ramen en deuren worden geplaatst

Aannemingen **VERELST**

Track Record



Plaatsen van het glas in schuifraam



Plaatsen van voordeur



Uitvoeren van pleisterwerken



Opvoegen van het huis

Plaatsen van verwarmingsbuizen
in badkamer en cementbepleistering
van de douche



Plaatsen van uitsparing voor speksteenkachel

Plaatsen van vloerisolatie op basis
van isomobolletjes



Gieten van chape

Plaatsen van de vloer



Aannemingen **VERELST**

Track Record



Plaatsen riolering



Plaatsen van verwarmingsketel
op zolder



Plaatsen van sanitaire toestellen



Opschuren blauwe hardsteen



OPGELEVERDE WONING
